



CITTA' DI CIRIE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "N.COSTA"

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA

CS 04

Dicembre 2019

Settore Servizi Tecnici, del Territorio e
dell'Ambiente
Dirigente del Settore
Arch. Maria Teresa Noto

Servizio Patrimonio
Responsabile del Servizio
Geom. Alessandro Bria Baret

Progettazione:
Ufficio Lavori Pubblici
Ing. Giacomino Ambrosi

Responsabile del Procedimento:
Geom. Alessandro Bria Baret

rev.	descrizione	data	redatto da:
0	PRIMA EMISSIONE	Dicembre 2019	Ing. Giacomino Ambrosi

DATI DI INPUT

COSTO MEDIO MANODOPERA	Euro	25
CONSEGNA LAVORI (presunta)		15/06/2020

ATTIVITA'	importo lavori da computo	incidenza M.O.	COSTO MANODOPERA	DURATA IN ORE LAV.	UOMINI GIORNO	SQUADRA TIPO	GIORNATE LAVORATIVE
<i>Consegna dei lavori e</i>							
<i>Preparazione cantiere</i>							2
SCUOLA COSTA	148 375,07						
Opere edili	53 434,26	0,4	16 350,88	654,04	81,75	6,00	14
Opere da serramentista	11 175,98	0,30	2 564,89	102,60	12,82	2,00	6
Opere da elettricista	10 162,49	0,38	2 954,24	118,17	14,77	2,00	7
Opere da idraulico	51 365,70	0,38	14 932,01	597,28	74,66	4,00	19
Opere da fabbro	1 152,05	0,30	264,40	10,58	1,32	2,00	1
Opere da decoratore	21 084,59	0,32	5 161,51	206,46	25,81	3,00	9
<i>Pulizie e smobilizzo</i>							3
<i>Fine lavori</i>							
TOTALI	148 375,07		45 097,44				60

DIAGRAMMA FINANZIARIO E PIANO DI AVANZAMENTO LAVORI

N. ord.	Fase Lavorativa	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata gg.	Importo Cumulativo Lavori Realizzati (€)
1	Consegna dei lavori e		15/06/2020	15/06/2020		
	Preparazione cantiere		15/06/2020	17/06/2020	2	
	SCUOLA COSTA					
2	Opere edili	53 434,26	17/06/2020	30/06/2020	14	53 434,26
3	Opere da serramentista	11 175,98	30/06/2020	07/07/2020	6	64 610,24
4	Opere da elettricista	10 162,49	07/07/2020	14/07/2020	7	74 772,73
5	Opere da idraulico	51 365,70	14/07/2020	02/08/2020	19	126 138,43
6	Opere da fabbro	1 152,05	02/08/2020	02/08/2020	1	127 290,48
7	Opere da decoratore	21 084,59	02/08/2020	11/08/2020	9	148 375,07
8	Pulizie e smobilizzo		02/08/2020	05/08/2020	3	
9	Fine lavori					

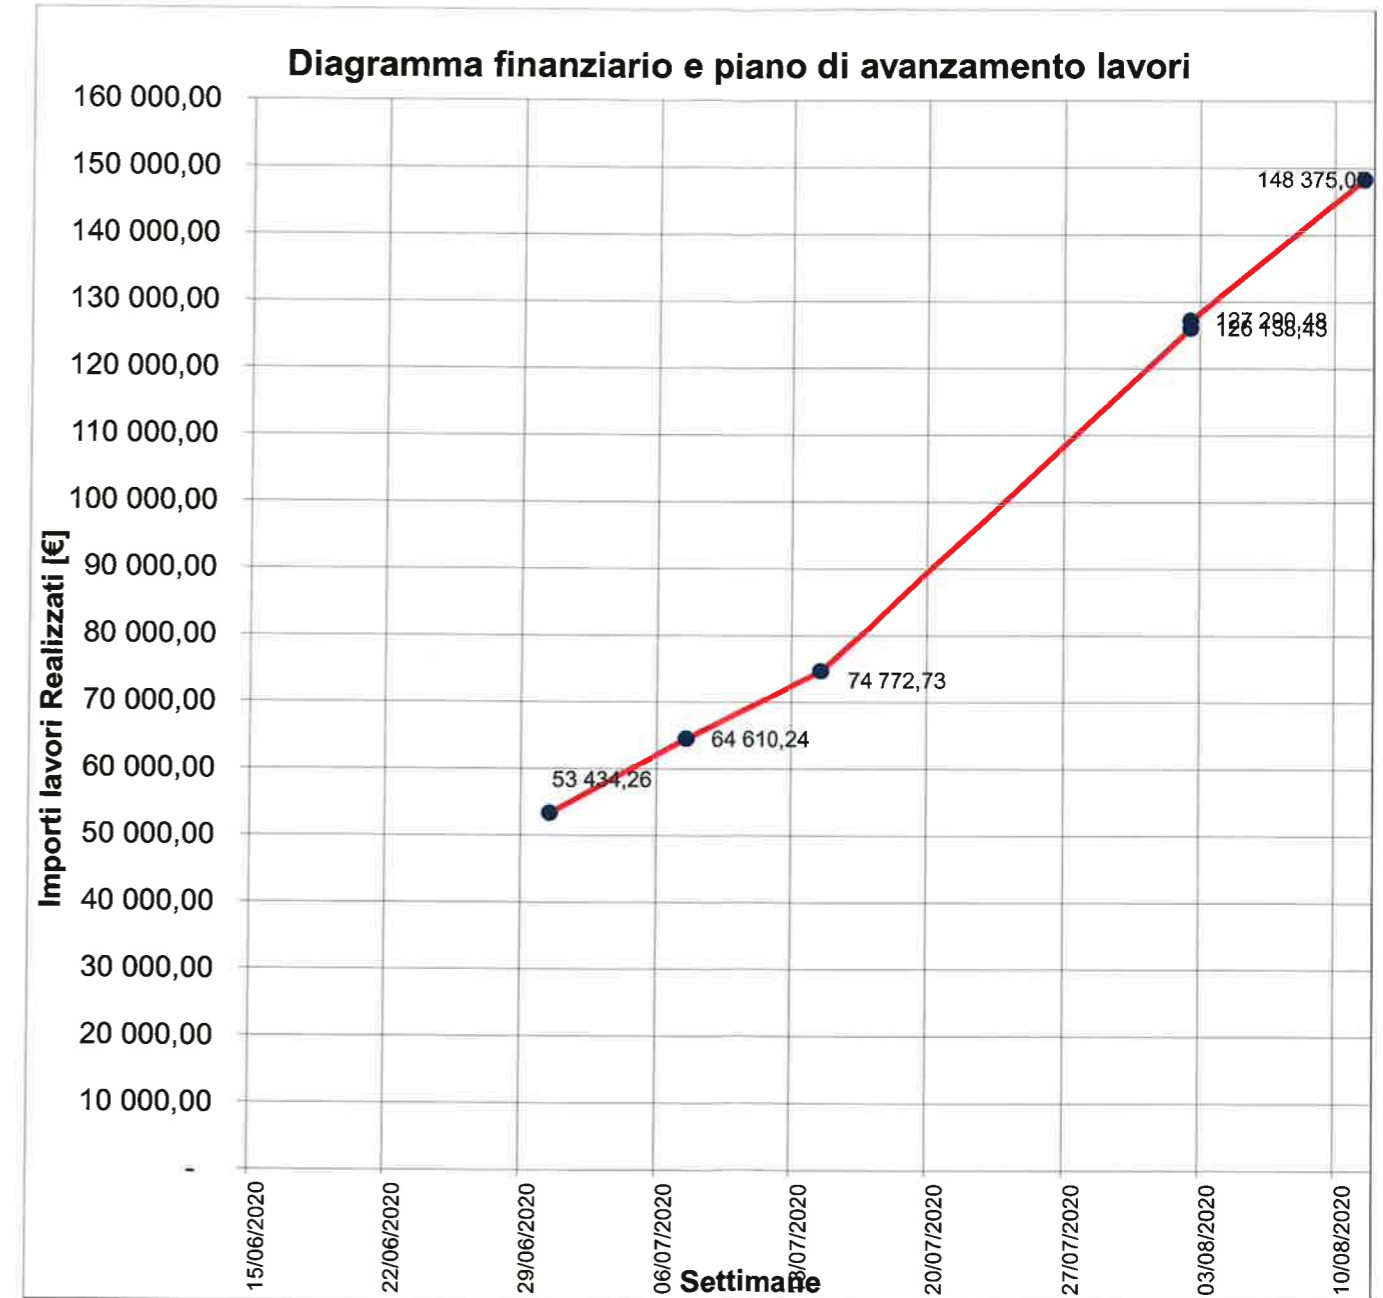


DIAGRAMMA DI GANTT

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Consegna dei lavori e	15/06/2020	15/06/2020	
	Preparazione cantiere	15/06/2020	17/06/2020	2
SCUOLA COSTA				
2	Opere edili	17/06/2020	30/06/2020	14
3	Opere da serramentista	30/06/2020	07/07/2020	6
4	Opere da elettricista	07/07/2020	14/07/2020	7
5	Opere da idraulico	14/07/2020	02/08/2020	19
6	Opere da fabbro	02/08/2020	02/08/2020	1
7	Opere da decoratore	02/08/2020	11/08/2020	9
8	Pulizie e smobilizzo	11/08/2020	14/08/2020	3
9	Fine lavori			60
DURATA		60 gg.	naturali e consecutivi	

