



CITTA' DI CIRIE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PERSONALE
DEL PRESIDIO SOCIOASSISTENZIALE "IL GIRASOLE",
SITO IN PIAZZA CASTELLO, N.8.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA	CS 04
Novembre 2022	
Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell'Ambiente Dirigente del Settore Arch. Maria Teresa Noto	Progettazione: Ufficio Lavori Pubblici Ing. Giacomino Ambrosi Responsabile del Procedimento: Ing. Giacomino Ambrosi

rev.	descrizione	data	redatto da:
0	prima emissione	Novembre 2022	Ing. Giacomino Ambrosi

DATI DI INPUT

COSTO MEDIO MANODOPERA	Euro	34
CONSEGNA LAVORI (presunta)		01/12/2022

ATTIVITA'	importo lavori da computo	incidenza M.O.	COSTO MANODOPERA	DURATA IN ORE LAV.	UOMINI GIORNO	SQUADRA TIPO	GIORNATE LAVORATIVE
<i>Consegna dei lavori e</i>							
<i>Preparazione cantiere</i>							2
	16 142,39						
OPERE EDILI	9 117,00	0,55	3 835,98	112,82	14,10	2,00	7
OPERE DA SERRAMENTISTA	2 156,92	0,30	495,01	14,56	1,82	2,00	1
OPERE DA ELETTRICISTA	1 178,84	0,45	405,82	11,94	1,49	1,00	1
OPERE DA DECORATORE	2 489,63	0,55	1 047,51	30,81	3,85	1,00	4
OPERE DA IDRAULICO	1 200,00	0,55	504,90	14,85	1,86	1,00	2
<i>Pulizie e smobilizzo</i>							3
<i>Fine lavori</i>							
TOTALI	16 142,39		6 289,22				20

DIAGRAMMA FINANZIARIO E PIANO DI AVANZAMENTO LAVORI

N. ord.	Fase Lavorativa	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata gg.	Importo Cumulativo Lavori Realizzati (€)
1	Consegna dei lavori e		01/12/2022	01/12/2022		
	Preparazione cantiere		01/12/2022	03/12/2022	2	
2	OPERE EDILI	9 117,00	03/12/2022	10/12/2022	7	9 117,00
3	OPERE DA SERRAMENTISTA	2 156,92	10/12/2022	10/12/2022	1	11 273,92
4	OPERE DA ELETTRICISTA	1 178,84	10/12/2022	12/12/2022	1	12 452,76
5	OPERE DA DECORATORE	2 489,63	12/12/2022	16/12/2022	4	14 942,39
6	OPERE DA IDRAULICO	1 200,00	16/12/2022	18/12/2022	2	16 142,39
7	Pulizie e smobilizzo		16/12/2022	19/12/2022	3	
8	Fine lavori					

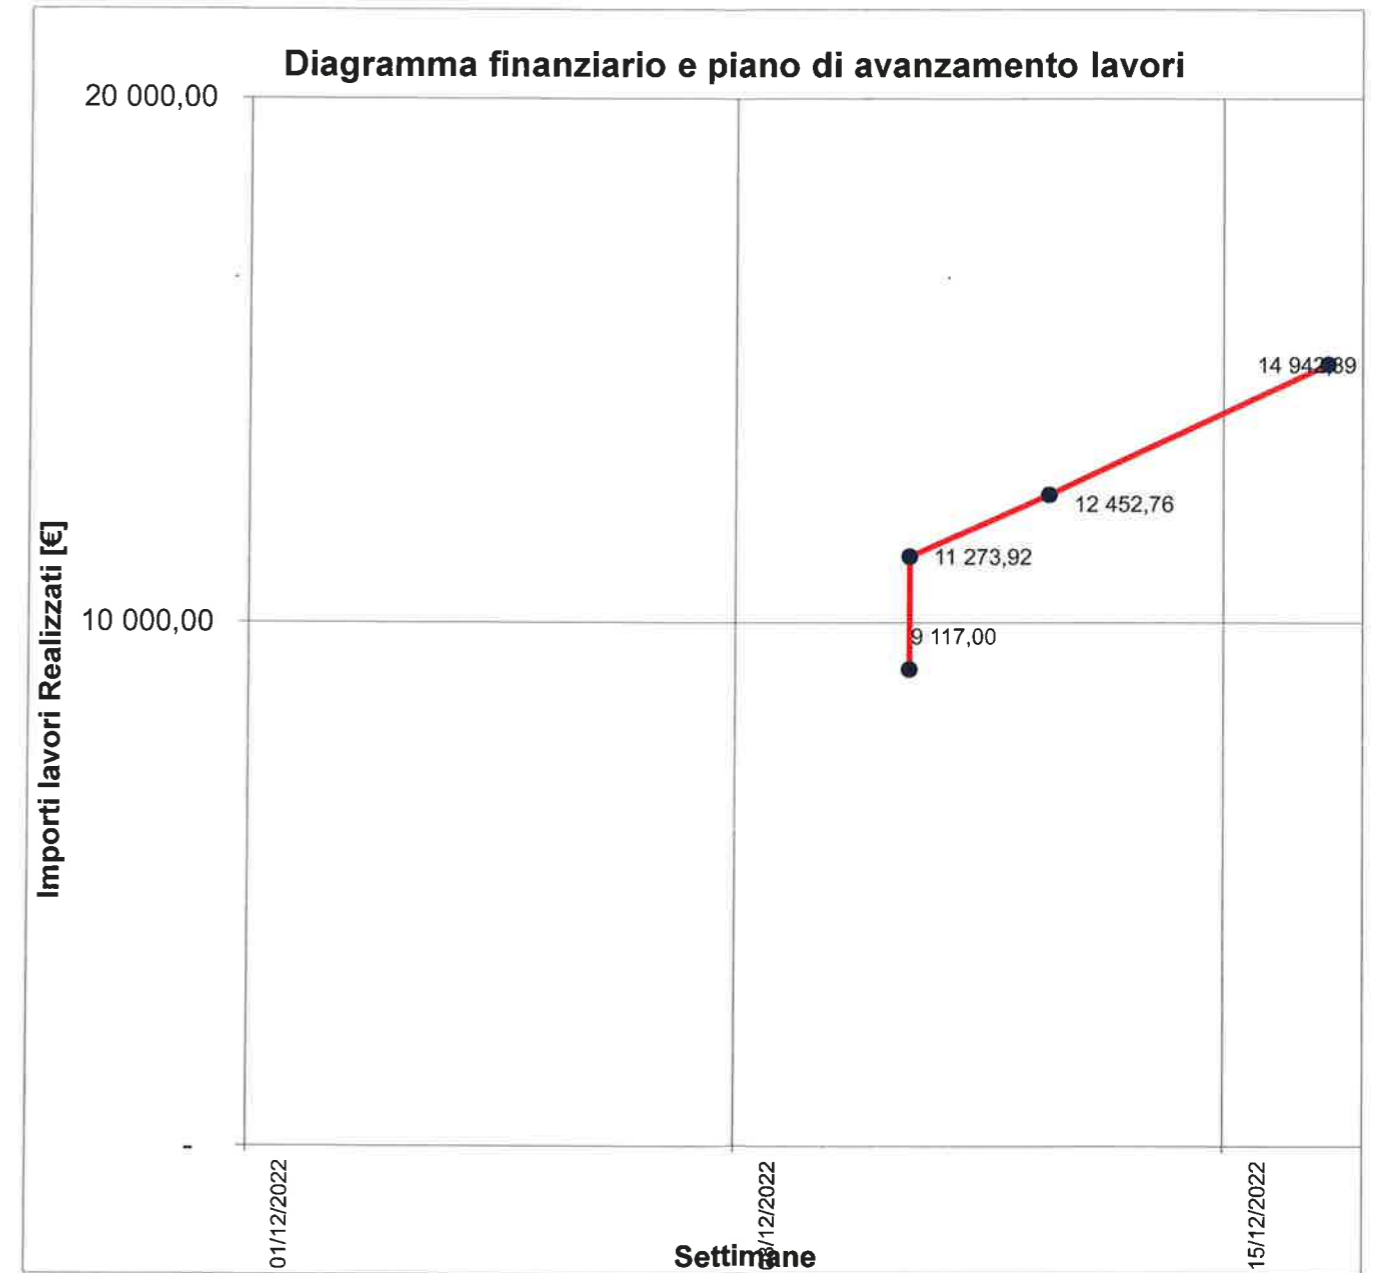


DIAGRAMMA DI GANTT

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Consegna dei lavori e	01/12/2022	01/12/2022	
	Preparazione cantiere	01/12/2022	03/12/2022	2
2	OPERE EDILI	03/12/2022	10/12/2022	7
3	OPERE DA SERRAMENTISTA	10/12/2022	10/12/2022	1
4	OPERE DA ELETTRICISTA	10/12/2022	12/12/2022	1
5	OPERE DA DECORATORE	12/12/2022	16/12/2022	4
6	OPERE DA IDRAULICO	16/12/2022	18/12/2022	2
7	Pulizie e smobilizzo	16/12/2022	19/12/2022	3
8	Fine lavori			20
DURATA		20 gg. naturali e consecutivi		

